

第 3 5 号議案

工事請負契約の変更について（上府～三代線（三代地区）道路新設工事（第 1 工区））

上府～三代線（三代地区）道路新設工事（第 1 工区）について、下記のとおり工事請負契約の一部を変更するものとする。

令和 8 年 3 月 3 日提出

新宮町長 桐 島 光 昭

記

1 変更工期

【変更後】自 令和 7 年 9 月 4 日
至 令和 8 年 7 月 3 1 日

【変更前】自 令和 7 年 9 月 4 日
至 令和 8 年 3 月 2 7 日

2 契約の方法

随意契約

理 由

上府～三代線（三代地区）道路新設工事（第 1 工区）について、他工事の影響により請負契約の内容を変更する必要性が生じたので、変更契約を締結するに当たり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 3 8 年新宮町条例第 4 号）第 2 条の規定により町議会の議決を求めるものである。

(参考資料)

(1) 変更理由

本工事区域では同時に三代土地区画整理組合による造成工事（以下「組合工事」という。）が施工されているが、組合工事に支障となる建物移転が遅れたことにより、組合工事が遅れ、後続して実施する本工事の着手が遅れることとなった。

以上のことから本工事期間の延長を行うものである。


(2) 契約の概要

契約の相手方


福岡県福岡市中央区舞鶴三丁目9番39号

株式会社フジタ九州支店

支店長 吉村 康男

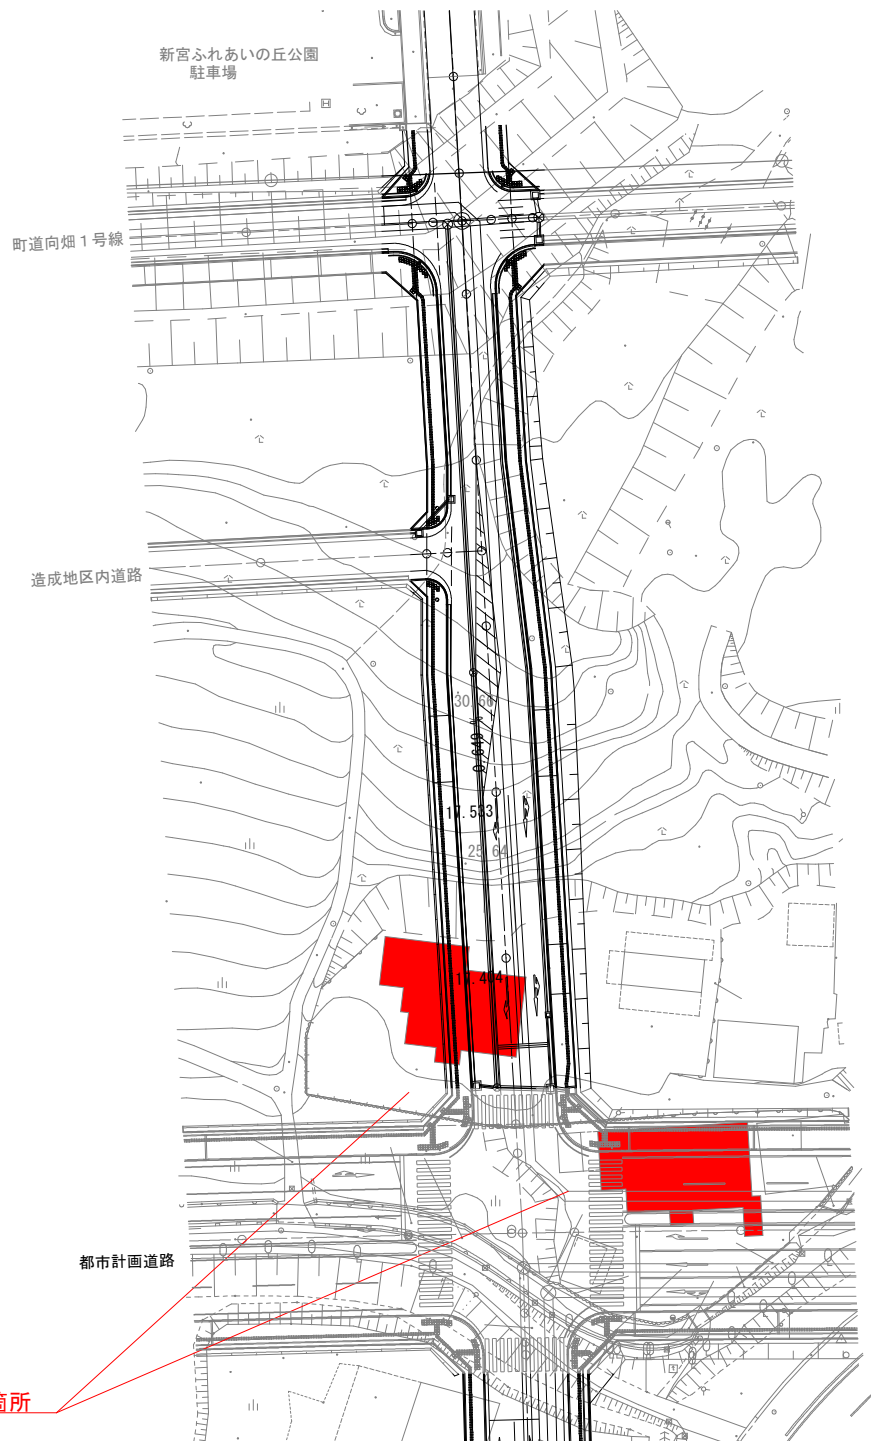

上府～三代線(三代地区)道路新設工事(第1工区)

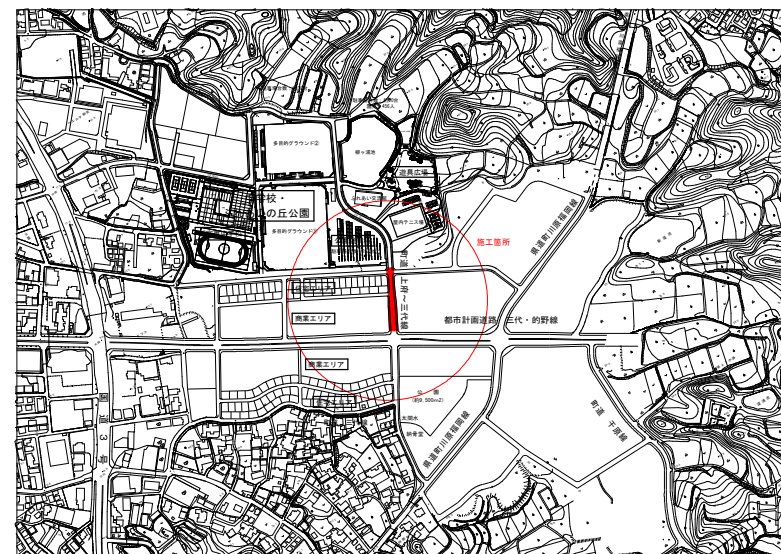

都市計画道路
